



CITTA' DI CASALE MONFERRATO

Provincia di Alessandria

I PERCORSI DEL COMMERCIO

Riqualificazione urbana
di via del Duomo, via Volpi,
via Paleologi, piazza Coppa
e parte di via Lanza

COMMITTENTE

Comune di Casale Monferrato
Via Mameli 10
15033 Casale Monferrato (AL)

PROGETTO

STUDIO DI ARCHITETTURA BALBI E RINAUDO



via A. Perfumo 1 15122 Spinetta Marengo (AL)
Tel. - Fax. : 0131 617473
e-mail: studio.ber@tin.it



Documento firmato anche digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
e norme collegate

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paola MAGGIOROTTI

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

Cronoprogramma dei lavori

DATA


06/2016


INDICE


A


ELABORATO

H

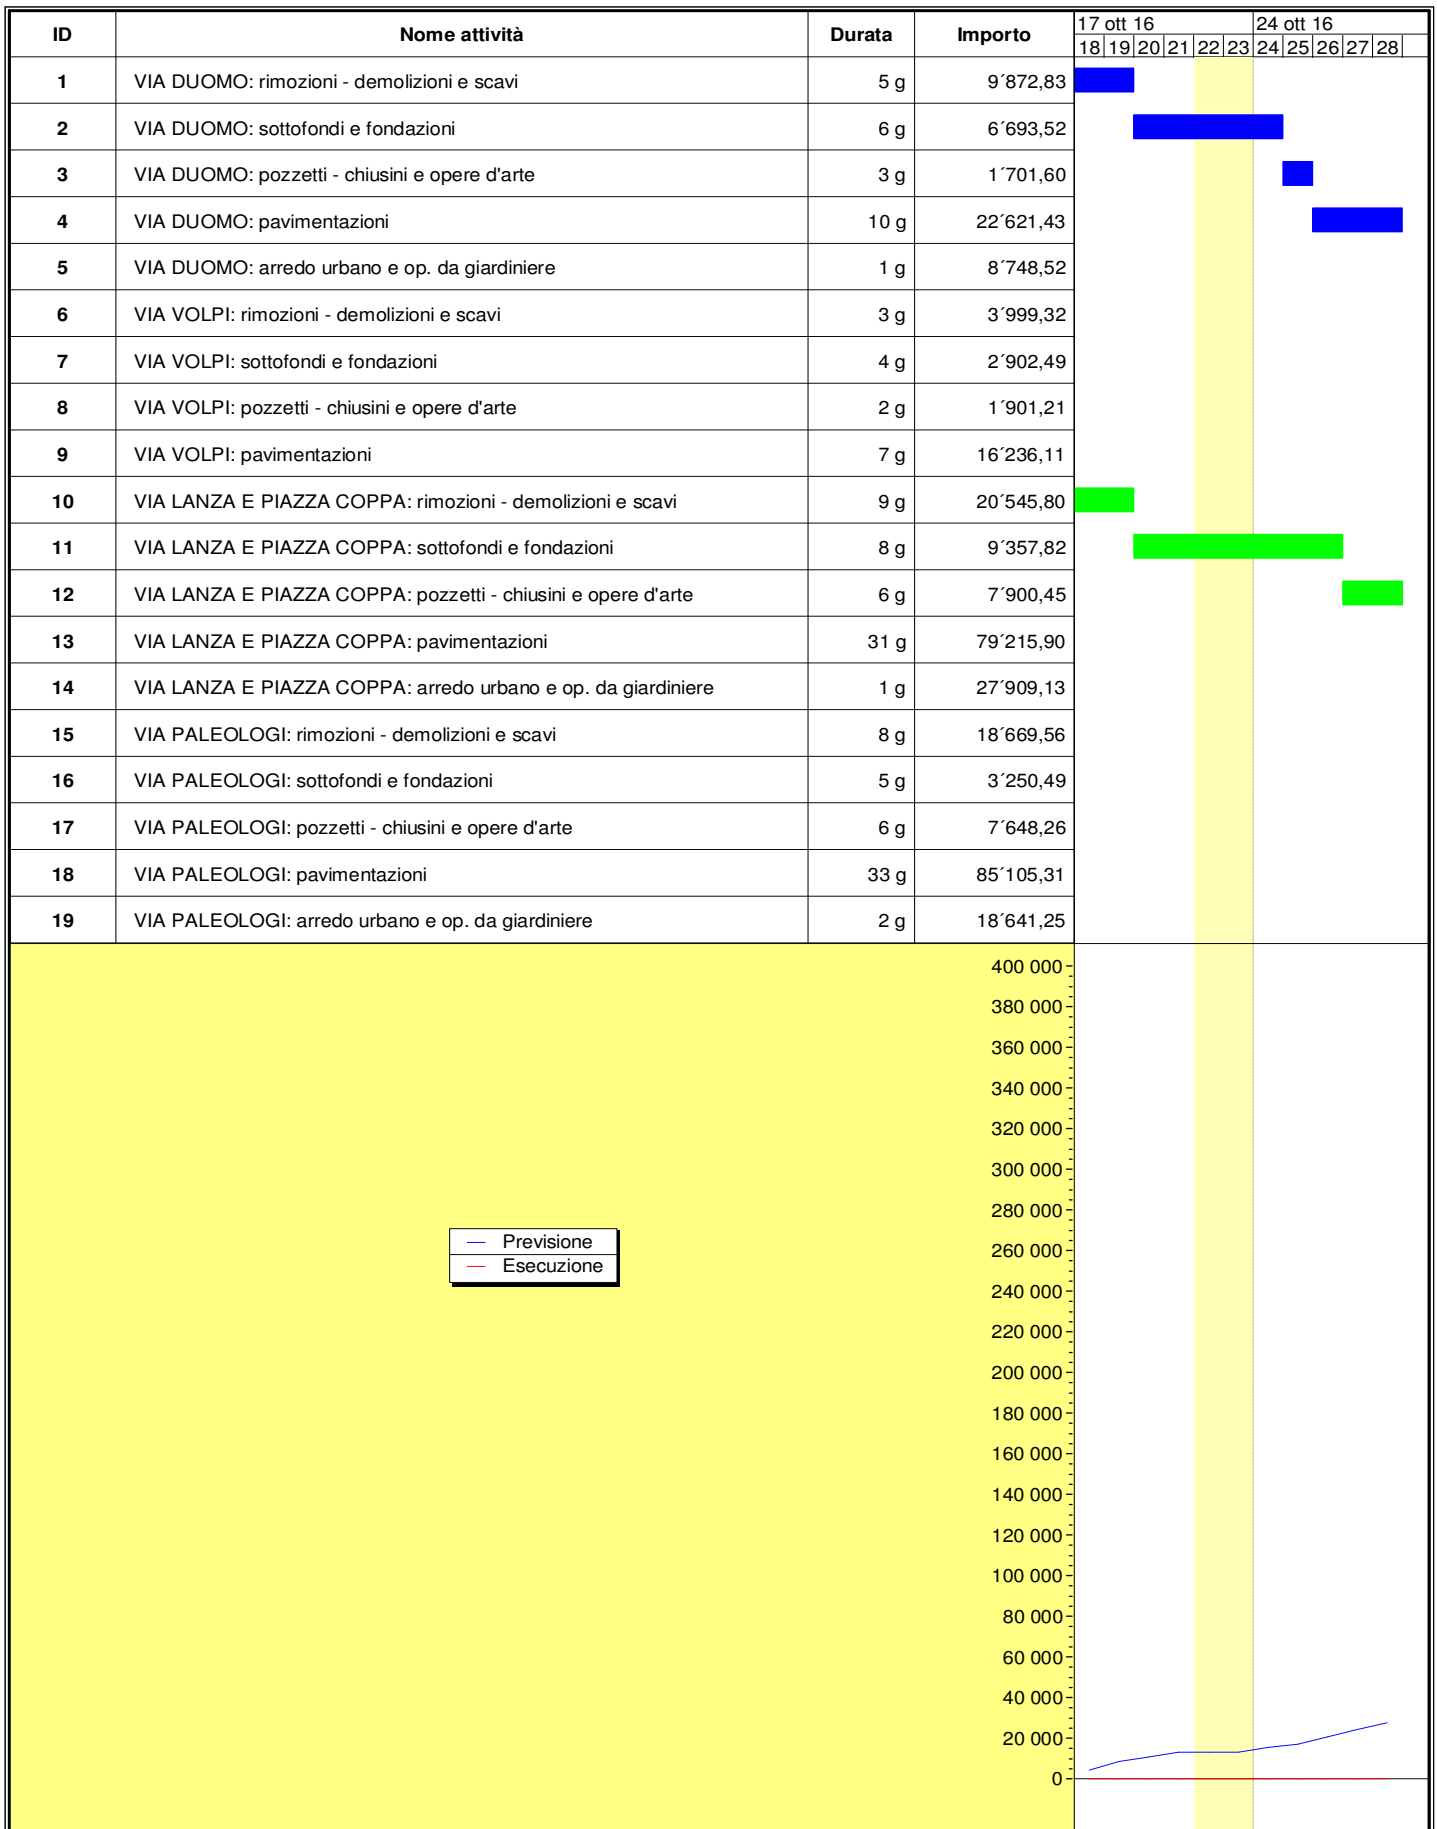

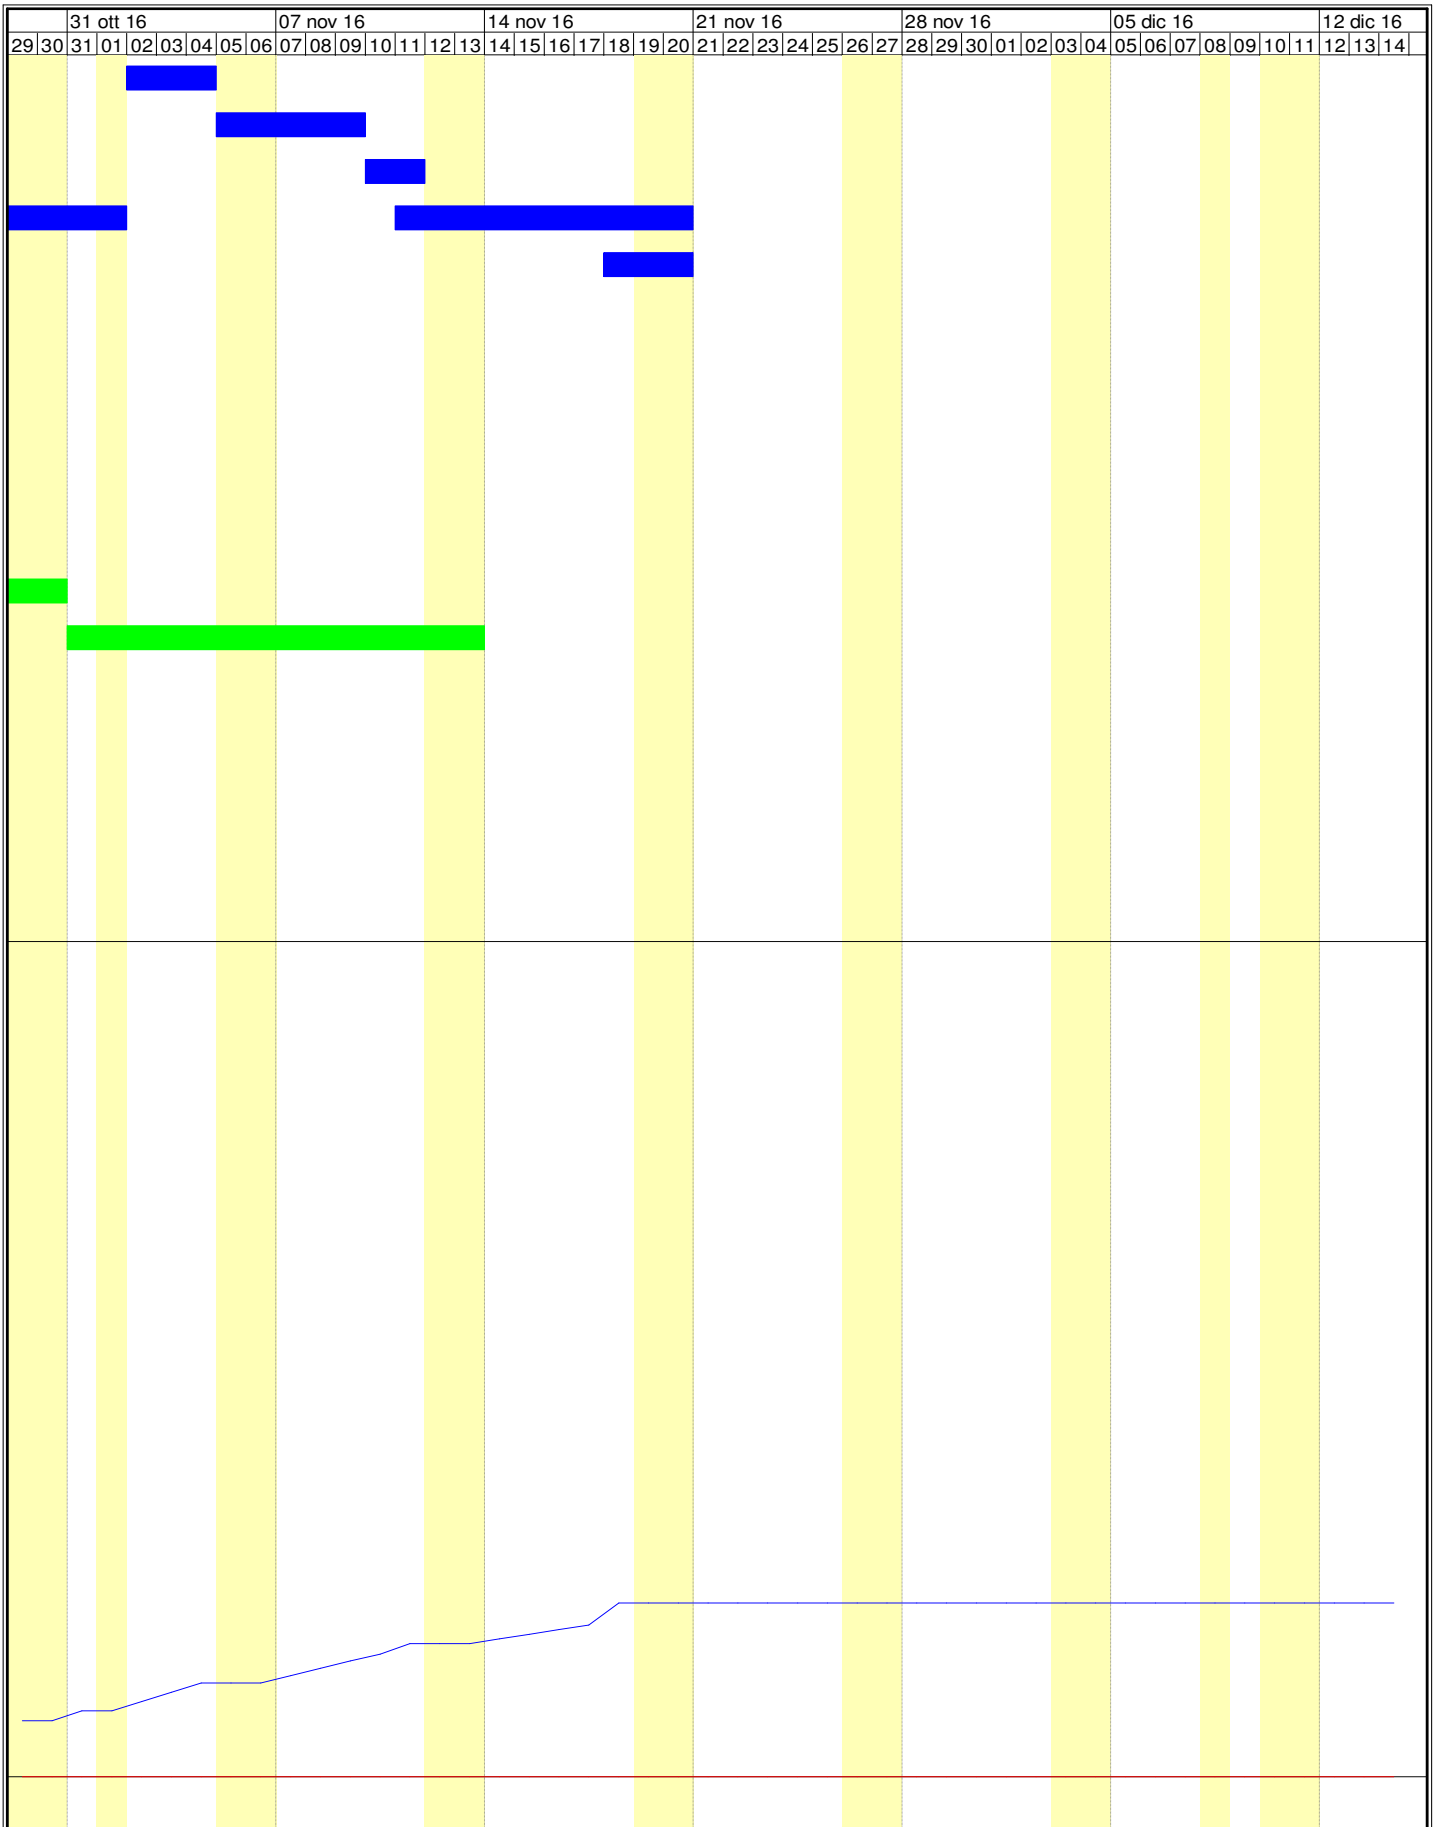

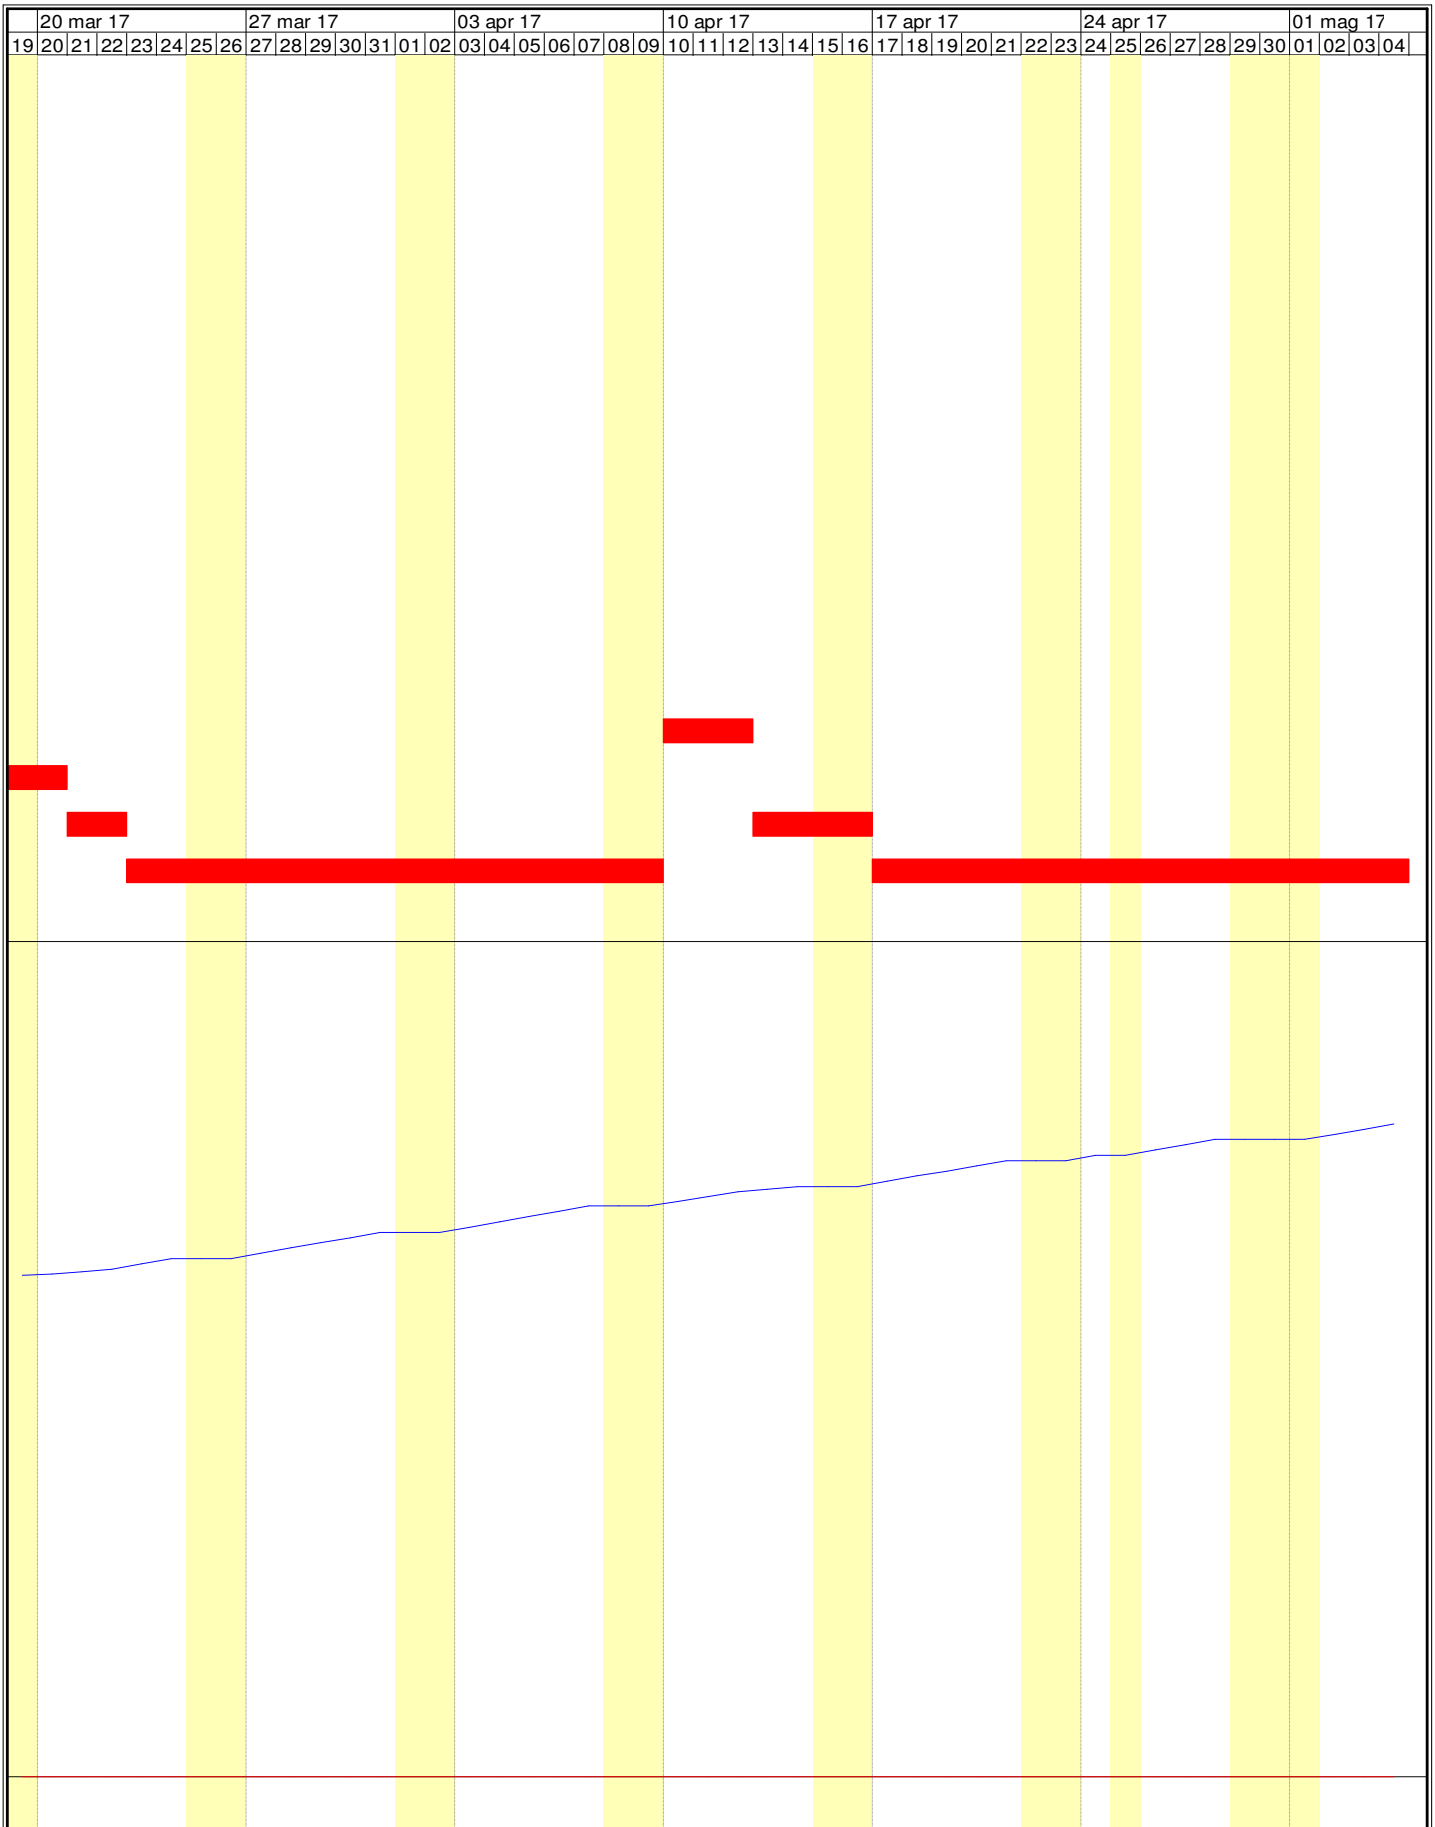

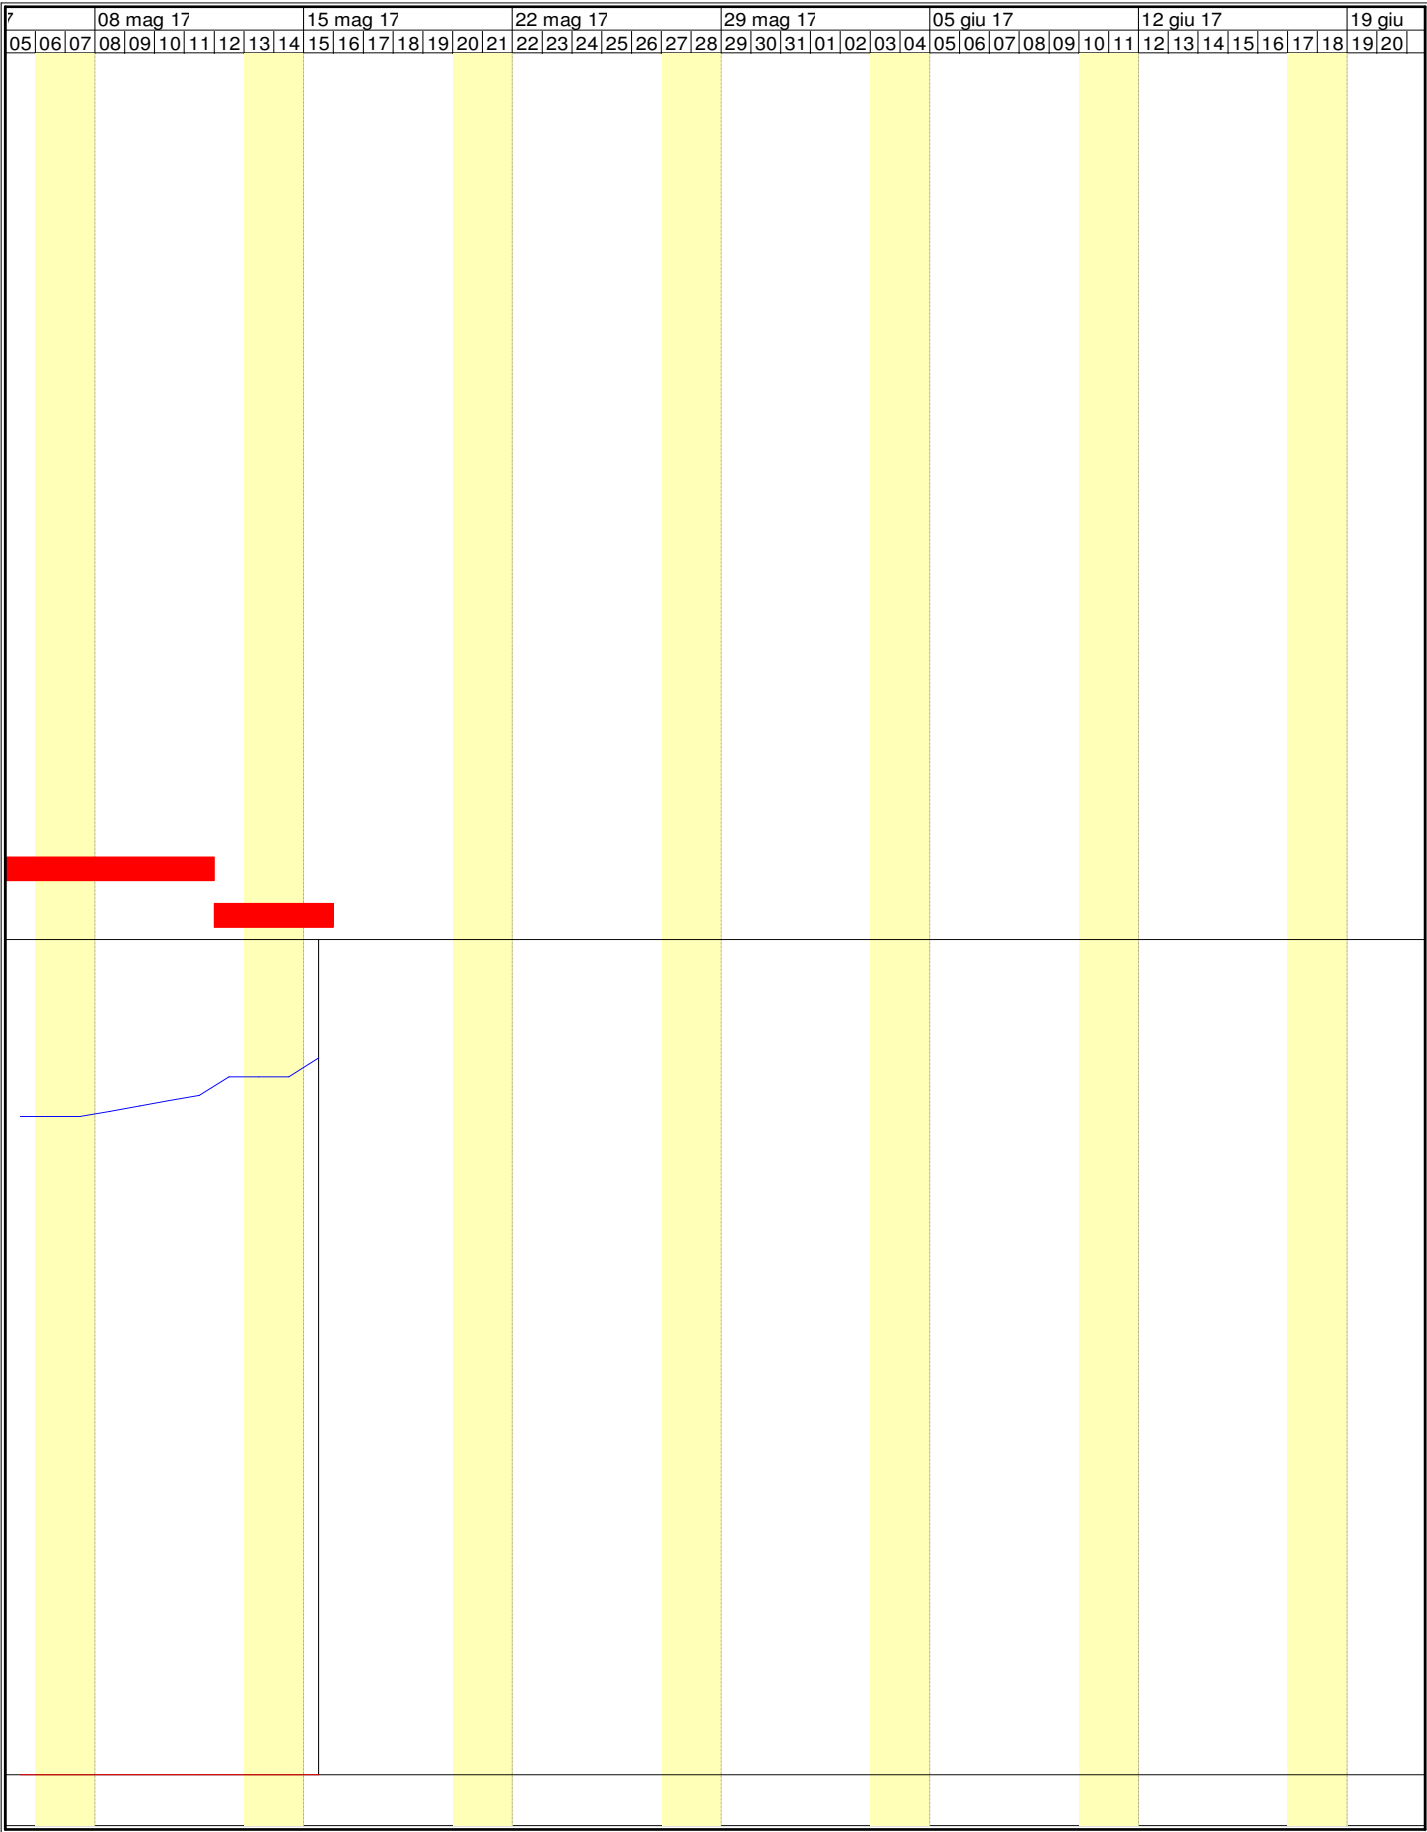

Città di Casale Monferrato

Provincia di Alessandria

Tabella Attività

OGGETTO: Interventi Strutturali del Programma di intervento del P.Q.U.
denominato: "I PERCORSI DEL COMMERCIO: Riqualificazione
urbana di via del Duomo, via Volpi, via Paleologi, piazza Coppa e
parte di via Lanza

COMMITTENTE: Città di Casale Monferrato

Casale Monferrato, 15/06/2016

Il Tecnico
()

ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
		Euro	(%)			Lav.	Tot.
VIA DUOMO: rimozioni - demolizioni e scavi		9'872,83	2,80	18/10/2016	04/11/2016	5	5
	<i>periodo 01</i>	3'949,13	1,12	18/10/2016	19/10/2016	2	2
	<i>periodo 02</i>	5'923,70	1,68	02/11/2016	04/11/2016	3	3
VIA DUOMO: sottofondi e fondazioni		6'693,52	1,90	20/10/2016	09/11/2016	6	10
	<i>periodo 01</i>	3'346,76	0,95	20/10/2016	24/10/2016	3	5
	<i>periodo 02</i>	3'346,76	0,95	05/11/2016	09/11/2016	3	5
VIA DUOMO: pozzetti - chiusini e opere d'arte		1'701,60	0,48	25/10/2016	11/11/2016	3	3
	<i>periodo 01</i>	567,20	0,16	25/10/2016	25/10/2016	1	1
	<i>periodo 02</i>	1'134,40	0,32	10/11/2016	11/11/2016	2	2
VIA DUOMO: pavimentazioni		22'621,43	6,41	26/10/2016	20/11/2016	10	17
	<i>periodo 01</i>	9'048,57	2,56	26/10/2016	01/11/2016	4	7
	<i>periodo 02</i>	13'572,86	3,85	11/11/2016	20/11/2016	6	10
VIA DUOMO: arredo urbano e op. da giardiniere		8'748,52	2,48	18/11/2016	20/11/2016	1	3
VIA VOLPI: rimozioni - demolizioni e scavi		3'999,32	1,13	09/01/2017	11/01/2017	3	3
VIA VOLPI: sottofondi e fondazioni		2'902,49	0,82	12/01/2017	17/01/2017	4	6
VIA VOLPI: pozzetti - chiusini e opere d'arte		1'901,21	0,54	18/01/2017	19/01/2017	2	2
VIA VOLPI: pavimentazioni		16'236,11	4,60	19/01/2017	29/01/2017	7	11
VIA LANZA E PIAZZA COPPA: rimozioni - demolizioni e scavi		20'545,80	5,82	18/10/2016	09/02/2017	9	9
	<i>periodo 01</i>	4'565,73	1,29	18/10/2016	19/10/2016	2	2
	<i>periodo 02</i>	6'848,60	1,94	09/01/2017	11/01/2017	3	3
	<i>periodo 03</i>	9'131,47	2,59	06/02/2017	09/02/2017	4	4
VIA LANZA E PIAZZA COPPA: sottofondi e fondazioni		9'357,82	2,65	20/10/2016	14/02/2017	8	12
	<i>periodo 01</i>	5'848,64	1,66	20/10/2016	26/10/2016	5	7
	<i>periodo 02</i>	3'509,18	0,99	10/02/2017	14/02/2017	3	5
VIA LANZA E PIAZZA COPPA: pozzetti - chiusini e opere d'arte		7'900,45	2,24	27/10/2016	16/02/2017	6	10
	<i>periodo 01</i>	2'633,48	0,75	27/10/2016	30/10/2016	2	4
	<i>periodo 02</i>	2'633,48	0,75	12/01/2017	15/01/2017	2	4
	<i>periodo 03</i>	2'633,48	0,75	15/02/2017	16/02/2017	2	2
VIA LANZA E PIAZZA COPPA: pavimentazioni		79'215,90	22,45	31/10/2016	26/02/2017	31	46
	<i>periodo 01</i>	22'998,16	6,52	31/10/2016	13/11/2016	9	14
	<i>periodo 02</i>	38'330,27	10,86	16/01/2017	05/02/2017	15	21
	<i>periodo 03</i>	17'887,46	5,07	16/02/2017	26/02/2017	7	11
VIA LANZA E PIAZZA COPPA: arredo urbano e op. da giardiniere		27'909,13	7,91	24/02/2017	26/02/2017	1	3
VIA PALEOLOGGI: rimozioni - demolizioni e scavi		18'669,56	5,29	27/02/2017	12/04/2017	8	8
	<i>periodo 01</i>	4'667,39	1,32	27/02/2017	28/02/2017	2	2
	<i>periodo 02</i>	7'001,09	1,98	13/03/2017	15/03/2017	3	3
	<i>periodo 03</i>	7'001,09	1,98	10/04/2017	12/04/2017	3	3
VIA PALEOLOGGI: sottofondi e fondazioni		3'250,49	0,92	01/03/2017	20/03/2017	5	7
	<i>periodo 01</i>	1'300,20	0,37	01/03/2017	02/03/2017	2	2
	<i>periodo 02</i>	1'950,29	0,55	16/03/2017	20/03/2017	3	5
VIA PALEOLOGGI: pozzetti - chiusini e opere d'arte		7'648,26	2,17	03/03/2017	16/04/2017	6	10
	<i>periodo 01</i>	2'549,42	0,72	03/03/2017	06/03/2017	2	4
	<i>periodo 02</i>	2'549,42	0,72	21/03/2017	22/03/2017	2	2
	<i>periodo 03</i>	2'549,42	0,72	13/04/2017	16/04/2017	2	4
VIA PALEOLOGGI: pavimentazioni		85'105,31	24,11	07/03/2017	11/05/2017	33	49
	<i>periodo 01</i>	10'315,80	2,92	07/03/2017	12/03/2017	4	6
	<i>periodo 02</i>	30'947,39	8,77	23/03/2017	09/04/2017	12	18
	<i>periodo 03</i>	43'842,13	12,42	17/04/2017	11/05/2017	17	25
VIA PALEOLOGGI: arredo urbano e op. da giardiniere		18'641,25	5,28	12/05/2017	15/05/2017	2	4
Casale Monferrato, 15/06/2016							
il Tecnico							

Città di Casale Monferrato

Provincia di Alessandria

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Interventi Strutturali del Programma di intervento del P.Q.U.
denominato: "I PERCORSI DEL COMMERCIO: Riqualificazione
urbana di via del Duomo, via Volpi, via Paleologi, piazza Coppa e
parte di via Lanza

COMMITTENTE: Città di Casale Monferrato

Casale Monferrato, 15/06/2016

Il Tecnico
()

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale Euro	Progressivo Euro	(%)
18/10/2016	4'257,43	4'257,43	1,21
19/10/2016	4'257,43	8'514,87	2,41
20/10/2016	2'285,31	10'800,18	3,06
21/10/2016	2'285,31	13'085,49	3,71
24/10/2016	2'285,31	15'370,81	4,36
25/10/2016	1'736,93	17'107,74	4,85
26/10/2016	3'431,87	20'539,61	5,82
27/10/2016	3'578,88	24'118,49	6,83
28/10/2016	3'578,88	27'697,38	7,85
31/10/2016	4'817,49	32'514,87	9,21
02/11/2016	4'529,92	37'044,79	10,50
03/11/2016	4'529,92	41'574,71	11,78
04/11/2016	4'529,92	46'104,62	13,06
07/11/2016	3'670,94	49'775,56	14,10
08/11/2016	3'670,94	53'446,50	15,14
09/11/2016	3'670,94	57'117,44	16,18
10/11/2016	3'122,55	60'239,99	17,07
11/11/2016	5'384,69	65'624,68	18,59
14/11/2016	2'262,14	67'886,83	19,24
15/11/2016	2'262,14	70'148,97	19,88
16/11/2016	2'262,14	72'411,11	20,52
17/11/2016	2'262,14	74'673,26	21,16
18/11/2016	11'010,66	85'683,92	24,28
09/01/2017	3'615,97	89'299,89	25,30
10/01/2017	3'615,97	92'915,87	26,33
11/01/2017	3'615,97	96'531,84	27,35
12/01/2017	2'042,36	98'574,20	27,93
13/01/2017	2'042,36	100'616,57	28,51
16/01/2017	3'280,97	103'897,54	29,44
17/01/2017	3'280,97	107'178,52	30,37
18/01/2017	3'505,96	110'684,47	31,36
19/01/2017	5'825,40	116'509,87	33,01
20/01/2017	4'874,80	121'384,67	34,39
23/01/2017	4'874,80	126'259,46	35,78
24/01/2017	4'874,80	131'134,26	37,16
25/01/2017	4'874,80	136'009,06	38,54
26/01/2017	4'874,80	140'883,85	39,92
27/01/2017	4'874,80	145'758,65	41,30
30/01/2017	2'555,35	148'314,00	42,02
31/01/2017	2'555,35	150'869,35	42,75
01/02/2017	2'555,35	153'424,70	43,47
02/02/2017	2'555,35	155'980,05	44,20
03/02/2017	2'555,35	158'535,41	44,92
06/02/2017	2'282,87	160'818,27	45,57
07/02/2017	2'282,87	163'101,14	46,21
08/02/2017	2'282,87	165'384,01	46,86
09/02/2017	2'282,87	167'666,87	47,51
10/02/2017	1'169,73	168'836,60	47,84
13/02/2017	1'169,73	170'006,33	48,17
14/02/2017	1'169,73	171'176,06	48,50
15/02/2017	1'316,74	172'492,80	48,88
16/02/2017	3'872,09	176'364,89	49,97
17/02/2017	2'555,35	178'920,24	50,70
20/02/2017	2'555,35	181'475,59	51,42
21/02/2017	2'555,35	184'030,95	52,15
22/02/2017	2'555,35	186'586,30	52,87
23/02/2017	2'555,35	189'141,65	53,59
24/02/2017	30'464,48	219'606,13	62,23
27/02/2017	2'333,70	221'939,83	62,89
28/02/2017	2'333,70	224'273,52	63,55
01/03/2017	650,10	224'923,62	63,73
02/03/2017	650,10	225'573,72	63,92
03/03/2017	1'274,71	226'848,43	64,28
06/03/2017	1'274,71	228'123,14	64,64
07/03/2017	2'578,95	230'702,08	65,37
08/03/2017	2'578,95	233'281,03	66,10
09/03/2017	2'578,95	235'859,98	66,83
10/03/2017	2'578,95	238'438,93	67,56
13/03/2017	2'333,70	240'772,63	68,22
14/03/2017	2'333,70	243'106,32	68,88
15/03/2017	2'333,70	245'440,02	69,55
16/03/2017	650,10	246'090,11	69,73
17/03/2017	650,10	246'740,21	69,91

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale Euro	Progressivo Euro	(%)
20/03/2017	650,10	247'390,31	70,10
21/03/2017	1'274,71	248'665,02	70,46
22/03/2017	1'274,71	249'939,73	70,82
23/03/2017	2'578,95	252'518,68	71,55
24/03/2017	2'578,95	255'097,63	72,28
27/03/2017	2'578,95	257'676,58	73,01
28/03/2017	2'578,95	260'255,53	73,74
29/03/2017	2'578,95	262'834,47	74,47
30/03/2017	2'578,95	265'413,42	75,20
31/03/2017	2'578,95	267'992,37	75,94
03/04/2017	2'578,95	270'571,32	76,67
04/04/2017	2'578,95	273'150,27	77,40
05/04/2017	2'578,95	275'729,22	78,13
06/04/2017	2'578,95	278'308,17	78,86
07/04/2017	2'578,95	280'887,12	79,59
10/04/2017	2'333,70	283'220,81	80,25
11/04/2017	2'333,70	285'554,51	80,91
12/04/2017	2'333,70	287'888,20	81,57
13/04/2017	1'274,71	289'162,91	81,93
14/04/2017	1'274,71	290'437,62	82,30
17/04/2017	2'578,95	293'016,57	83,03
18/04/2017	2'578,95	295'595,52	83,76
19/04/2017	2'578,95	298'174,47	84,49
20/04/2017	2'578,95	300'753,42	85,22
21/04/2017	2'578,95	303'332,36	85,95
24/04/2017	2'578,95	305'911,31	86,68
26/04/2017	2'578,95	308'490,26	87,41
27/04/2017	2'578,95	311'069,21	88,14
28/04/2017	2'578,95	313'648,16	88,87
02/05/2017	2'578,95	316'227,11	89,60
03/05/2017	2'578,95	318'806,06	90,33
04/05/2017	2'578,95	321'385,01	91,06
05/05/2017	2'578,95	323'963,95	91,80
08/05/2017	2'578,95	326'542,90	92,53
09/05/2017	2'578,95	329'121,85	93,26
10/05/2017	2'578,95	331'700,80	93,99
11/05/2017	2'578,95	334'279,75	94,72
12/05/2017	9'320,63	343'600,38	97,36
15/05/2017	9'320,63	352'921,00	100,00
Casale Monferrato, 15/06/2016			
il Tecnico			
