



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA
DI CENSIMENTO

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA

Id. Scheda n. 3

Data(gg/mm/aa)

Compilatore

Nome FILIBERTO Cognome MANFREDI

Qualifica Professionale (Titolo di Studio): INGEGNERE

☒ Libero Professionista ☐ Dipendente Comunale / Unione Comuni
per conto del Comune / Unione Comuni / C.O.M. di CASALE MONFERRATO

Firma _____

Tipologia Area:

- 1 ☐ Area di Attesa o di Raccolta (Meeting Point)
2 ☐ Area di Ammassamento Materiali e Mezzi
3 ☒ Area di Ricovero o di Accoglienza: **Campo sportivo comunale Roncaglia**
3.1 ☐ Area adibita ad altre funzioni, ma con infrastrutture primarie esistenti (Struttura Ricettiva)
3.1.1 **Struttura Residenziale:**
☐ Abitazione Privata
☐ Abitazione Collettiva
☐ Impianto Sportivo
☐ Altro _____
3.1.2 **Struttura Turistica:**
☐ Albergo / Hotel / Pensione
☐ Ostello / Affittacamere
☐ B&B / Agriturismo
☐ Campeggio / Area attrezzata
☐ Altro _____
3.2 ☐ Struttura impropria, ma comunque idonea ad accogliere popolazione previa integrazione con servizi ausiliari
3.2.1 **Struttura dell'Istruzione:**
☐ Asilo
☐ Scuola (Elementare/Media/Superiore)
☐ Collegio
☐ Convitto
☐ Altro _____
3.2.2 **Struttura Sanitaria:**
☐ Ospedale
☐ Presidio Sanitario
☐ Casa di cura
☐ Casa di riposo
☐ Altro _____
3.2.3 **Struttura Religiosa:**
☐ Chiesa
☐ Convento
☐ Edificio di culto
☐ Altro _____
3.2.4 **Struttura Civile:**
☐ Municipio
☐ Sede Comunale decentrata
☐ Struttura Comunale collettiva
☐ Altro _____
3.3 ☒ Area potenzialmente utilizzabile
☒ per Tendopoli
☐ per Moduli Abitativi (Provvisori - Containers - o SemiPermanenti - Prefabbricati)
3.4 ☐ Campo nomadi/profughi esistente
☐ Tendopoli
☐ Roulottopoli

Regione PIEMONTE

Cod. Istat _____

Provincia ALESSANDRIA (AL)

Cod. Istat _____

Comune CASALE MONFERRATO

Cod. Istat 006039

C.O.M. di riferimento n° 1

Dati Catastali

Allegato _____

Foglio 100

Particelle 378

Sub _____

Frazione/Località CASALE MONFERRATO

Indirizzo Via Provinciale

Num. Civico C.A.P. 15033

Coordinate geografiche (ED50 - UTM fuso 32-33)

E

Fuso

N

3 2

Proprietà ☒ Pubblica ☐ Privata

Area sottoposta a convenzione ☐ Sì ☐ No

Proprietario COMUNE DI CASALE MONFERRATO

Utilizzatore

Area formalmente prevista nel Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile

☒ Sì ☐ No

Referente Area

IMARISIO ENRICO

Funzione/Ruolo GESTORE Tel./Cell. 346 8788564



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE


SCHEDA SPEDITIVA
DI CENSIMENTO

SEZIONE 2 - INQUADR. GEOGRAFICO, URBANISTICO E AMB. DELL'AREA (SUPERFICIE)/STRUTTURA (EDIFICIO)

INQUADRAMENTO P.R.G. / C.T.R.



INQUADRAMENTO CATASTALE

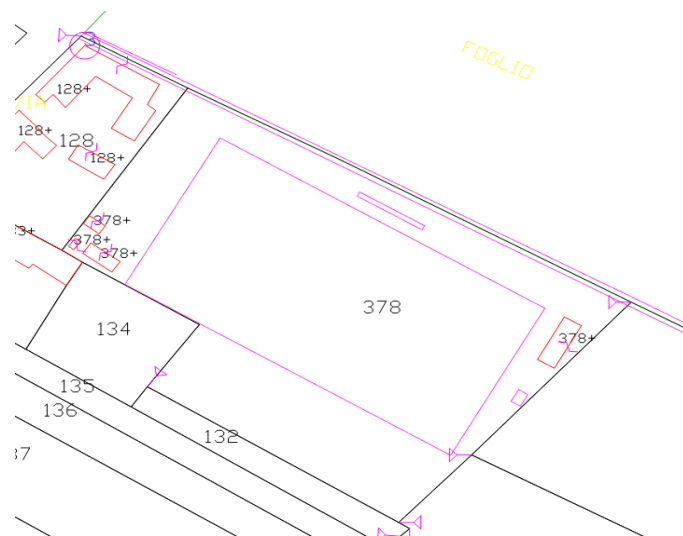

Destinazione d'uso (uso prevalente)		Aree con preminente destinazione a pubblici servizi afferenti la residenza (campo sportivo)							
Zona da P.R.G.	Bsr					Soggetta a esproprio			
Vincolo archeologico		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Vincolo paesaggistico		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Esondabilità (Rischio idrologico)		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					Presenza dissesti franosi (Rischio geologico)	
Rischio P.A.I. (se perimetro)		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Frane	O R1	O R2	O R3	O R4					Pericolosità P.A.I. (se perimetro)
Esondazioni	O R1	O R2	O R3	O R4	Frane	O P1	O P2	O P3	O P4
Rischio Incidente Rilevante/N.B.C.R.		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Prossimità elettrodotti/gasdotti/acquedotti o linee aeree		O Si	O No					O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Prossimità a discariche / imp. depurazione		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					Pericolo eventuale crollo strutture vicinali	
Prossimità a discariche / imp. depurazione		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Prossimità a discariche / imp. depurazione		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					Prossimità a magazzini/serbatoi liquidi/gas infiammabili	
Prossimità a discariche / imp. depurazione		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
Prossimità a discariche / imp. depurazione		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No					Altro	
Prossimità a discariche / imp. depurazione		O Si	<input checked="" type="checkbox"/> No						



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it

2

Rev. Ottobre 2013



Rev. Ottobre 2013



PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

AREE DI EMERGENZA
AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE

SCHEDA SPEDITIVA
DI CENSIMENTO

SEZIONE 5 PRE-DIMENSIONAMENTO AREA DI RICOVERO	
PER TENDOPOLI	PER MODULI ABITATIVI PROVVISORI (CONTAINERS)
Popolazione stimata da ricoverare	
N. tende da prevedersi 224 (rif. n. 1 tenda MPI 88 dim. 6 x 4.5 = 6 p. = 27 mq))	N. containers ISO 20 da prevedersi 86 (rif. n. 1 container ISO20 dim. 6x3 = 1/2 p. =18 mq)) Area di pertinenza min. pari a 70 mq – spaziatura 2 m
N. “moduli base” da prevedersi 27 (rif. “1 modulo base” = n. 4 tende MPI 88 = 24 p.) Area di pertinenza pari a 225 mq – spaziatura tra tende di 4.5 m	N. containers ISO 40 da prevedersi 54 (rif. n. 1 container ISO40 dim. 12x3 = 4/8 p. =36 mq)) Area di pertinenza min. pari a 113 mq – spaziatura 2 m
N. “moduli 32” equivalenti: 2 (rif. 1 “modulo 32” = n. 8 “moduli base” = 192 p.) Area di pertinenza pari a 3.025 mq = a metà campo da calcio 55x55 – spaziatura tra moduli base di 4 m	N. containers ISO 40dis per disabili da prevedersi 54 (rif. n. 1 container ISO40dis dim. 12x3 = 1 disabile =36 mq)) Area di pertinenza min pari a 113 mq – spaziatura 2 m
N. tende uso segreteria/infermeria/vigilanza- da prevedersi 1 (rif. 1 tenda dim 12x2.5 ogni 2 “moduli 32” = 384 p.= 30 mq)	N. moduli a schiera ISO40 da prevedersi 27 (blocchi di n.2 containers ISO40 con pertinenza pari a 226 mq)
N. tende uso mensa/chiesa/scuola/ricreativo da prevedersi 1 (rif. 1 tenda dim. 12x15 di ogni tipo ogni 2 “moduli 32” = 384 p. = 180 mq)	N. moduli a corte “Tipo 2” da prevedersi 11 (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 557 mq)
N. docce da prevedersi (rif. 1 doccia ogni 30÷50 p.) 19	N. moduli a corte “Tipo 3” da prevedersi 11 (n. 2 ISO40 + n. 3 ISO20 con area di pertinenza pari a 557 mq)
N. WC da prevedersi (rif. 1 WC ogni 6 ÷10 p.) 77	
N. lavabi da prevedersi (rif. 1 lavabo ogni 10 p.) 77	N. moduli a corte “Tipo 4” da prevedersi 8 (n. 5 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 770 mq)
N. Container servizi igienici da prevedersi 13 (rif. 1 container dim. 7x3 = n. 6 lavabi + n. 6 WC + n. 2 docce = 21 mq)	
N. KW da prevedersi 300 (rif. 4 KW min. ogni tenda pari a 1 generatore 150 KW ogni “modulo 32”)	N. moduli a corte “Tipo 5” da prevedersi 8 (n. 4 ISO40 + n. 2 ISO20 con area di pertinenza pari a 799 mq)
Dotazione idrica min.da prevedersi (rif. 10+5 = 15 lt/p) 11520	N. moduli a disp. varia “Tipo 6” da prevedersi 13 (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 476.5 mq)
N. punti acqua potabile da prevedersi (rif. 1 punto ogni 80÷100p.) 8	
N. centri rifiuti da prevedersi (rif. 1 centro ogni 40÷50 p.) 15	N. moduli a disp. varia “Tipo 7” da prevedersi 11 (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 566 mq)
N. estintori a polvere da prevedersi 27 (rif. 1 estintore ogni “modulo base” = 4 tende)	N. moduli a disp. varia “Tipo 7” da prevedersi (n. 4 containers ISO40 con area di pertinenza pari a 565.5 mq)

Pop max ricoverabile: 768 persone

pop max ricoverabile 428 persone



Referente: arch. M. Piccione

marco.piccione@provincia.alessandria.it

4

Rev. Ottobre 2013
